

防災収納庫 仕様書

1	物件名称	防災収納庫
2	品質・形状・寸法 又は型式	別紙、防災収納庫特記仕様書のとおり
3	グリーン物品 の指定	指定しない
4	数 量 (単価契約の場合 は予定数量)	1台
5	納入期限	令和6年(2024年)3月29日
6	納入場所	別紙、防災収納庫特記仕様書のとおり
7	特記事項	別紙、防災収納庫特記仕様書のとおり
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市市長室危機管理課 飯塚 TEL:046-822-9620

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

# 防災収納庫 特記仕様書

## 1 総則

この仕様書は、令和5年度に横須賀市（以下「本市」という。）が購入し、田浦中学校に設置する防災収納庫について必要な事項を定めるものである。

## 2 品名・購入数

防災収納庫 1台

## 3 仕様・規格等（別紙1見本参照）

### （1）本体

スチール製・新品 20 フィートコンテナ

### （2）寸法

長さ 6058mm×幅 2438mm×高さ 2591mm 程度

### （3）材質・強度

- ・材質・強度については、「安全なコンテナに関する国際条約（CSC 条約）」に定められた規格・試験に合格するものであること。
- ・CSC プレートの取得は不要であるが、同等の性能を有する旨の証明書類を提出すること。

### （4）扉

- ・両側外開き観音扉（高さ 2295mm×幅 2340mm程度）とし、本体の長辺中央部分に1か所設置すること。
- ・扉を開いたとき、開いた状態を維持できるよう、鎖状の留め金とL型フックを取り付けること。
- ・扉には、鎖状の留め金を留めるためのL型フックを取り付けること。
- ・扉のロックは、シングルタイプにすること。

### （5）鍵ボックス用U型フック

- ・扉の外側に鍵ボックスを掛けるためのU型フックを、4か所設置すること。
- ・設置場所は、本体の各短辺中央部分と扉の左右に取り付けること。
- ・詳細な設置場所は、別途協議をすること。

### （6）内装

- ・床には、1,500 kg程度の重さに耐えられる厚さのコンパネを選定し、同一色で敷くこと。
- ・内壁については、棚が固定できる程度の壁厚にすること。

### （7）換気口

- ・200mm×100mm程度の換気口（外部フード付き）を4か所に設置すること。
- ・設置場所は、長辺両角上部に設置すること。

### （8）外装

- ① 遮熱塗装

(本体) 日塗工番号 N-95

マンセル色 N9.5

RGB RGB (244 246 242)

塗装の色に関しては、上記の色と同等の色とすること。

② 防錆塗装

コンテナの錆を防ぐ塗装を施すこと。

(9) 表示

- ・ 防災収納庫正面扉部に「防災収納庫」及び「横須賀市 No.○」と表示すること。
- ・ 文字に関しては、カッティングシートを使用すること。

(番号) 田浦中学校 No. 2

(書体) ゴシック体

(大きさ) 高さ 300mm×幅 300mm程度 防災収納庫

高さ 150mm×幅 150mm程度 横須賀市 No.○

(文字色) 日塗工番号 19-20B

マンセル色 10-YR2/1

RGB RGB (49 43 40)

文字の色に関しては、上記の色と同等の色とすること。

(10) 基礎

- ・ 300 mm×300 mm×300mm のコンクリートブロックを4個使用し、倉庫本体にホールインアンカー等で固定する。設置状況により、コンクリートブロックの大きさは、他のサイズを使っても可能とする。
- ・ 新しい基礎を設置する場合、扉の入口部分が地面から 150mm程度の高さになるよう調整すること。

(11) 付属品

① スチール製軽量棚 (長さ 1500mm×幅 450mm×高さ 1800mm)

- ・ 内部の両サイド・扉正面部に4台設置・固定すること。
- ・ 棚板の数は4枚とすること。
- ・ 棚の強度は、150 kg程度の重量に耐えられるものとする。
- ・ 組立てにかかる費用は、供給者負担とすること。
- ・ 設置場所は、別途指示する。

② 落下防止用ネット

- ・ スチール製軽量棚の棚前面を覆うゴム製ネット (フック付き) とすること。
- ・ ネットの数は4枚とすること。

③ すのこ

- ・ ジョイント可能なプラスチック製すのこ (300 mm×300 mm) とすること。
- ・ すのこの数は20枚とすること。

4 設置場所

本市が指定する以下の市立中学校とし、これに係る運搬費は供給者負担とする。  
また、学校内の設置場所や搬入箇所等については、別途協議をすること。

(1) 田浦中学校（横須賀市船越町7-66）

5 既存防災収納庫の撤去・中身の入れ替え等について（別紙2参照）

- (1) 防災収納庫を設置する際、中身の入れ替えを行うため、学校敷地内の他の場所に仮置きすること。
- (2) 中身の入れ替えが終わり次第、既存の防災収納庫を撤去・引き取りを行い、解体後の写真を提出すること。
- (3) 中身の入れ替えに関しては、本市が行うため、仮置き場所・日程等に関して十分協議を行うこと。
- (4) 既存防災収納庫に設置してある付属品（棚・スロープ等）を引き上げること。

6 提出書類

- (1) 製作工程予定表（任意様式）を契約後10日以内に提出すること。
- (2) 防災収納庫製作前に設計図面を作成・提出し、了解を得ること。
- (3) CSCプレートと同等の性能を有する旨の証明書類に関しては、コンテナ設置前に提出すること。

7 納入期限

令和6年（2024年）3月29日

8 保証

保証期間は、納入完了の日から1年間とし、無償にてメンテナンスを行うこと。

この期間において材質、組立等の不良による故障、及び破損等の欠陥を認めたときは、その修理費用（部品代金も含む）は無償にて修理するものとする。

9 その他

- (1) 搬出入及び設置については、法令順守に努めると同時に、安全対策を十分に講じ、必要人員を確保すること。
- (2) 本業務にあたり、学校施設等の破損・汚損等を生じた場合は、供給者の責任において原状回復すること。
- (3) 必要に応じて整地を行うこと。
- (4) この仕様書に定めるほか、詳細は係員と十分な打ち合わせを行うものとし、疑義が生じた場合は、速やかに係員と協議の上適正を図ること。

防災収納庫 見本



## 防災収納庫 細部



シングルロック・鎖状の留め金・L型フック（扉の左右）




留め金用のL型フック（長辺左右）



鍵ボックス用のU型フック（扉の左右）  
本体の各短辺中央部分にも設置  
合計4か所（鍵ボックスは当課で準備）



外部フード

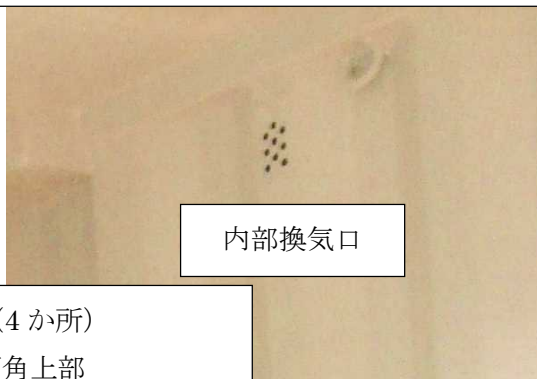


内部換気口

換気口（4か所）  
長辺両角上部



軽量棚（棚板4枚×4台）設置場所は別途指示



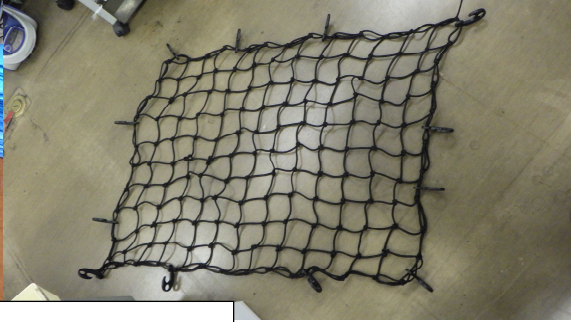

転落防止用ネット（4枚）



ジョイント式プラスチック製の  
このこ  
(30 cm × 30 cm) 20枚

撤去する既存防災収納庫と新規防災収納庫設置場所の現場写真

## 1 田浦中学校

### ① 撤去する既存防災収納庫

スチール製・No. 2（長さ 6000mm×幅 2400mm×高さ 2550mm）



### ② 更新後の設置場所

校舎東側、プール入口付近に変更。基礎工事あり。

